


Innenausbau läuft



Im Gebäude D wurden Lüftungsleitungen eingebaut. Diese werden zurzeit gedämmt.

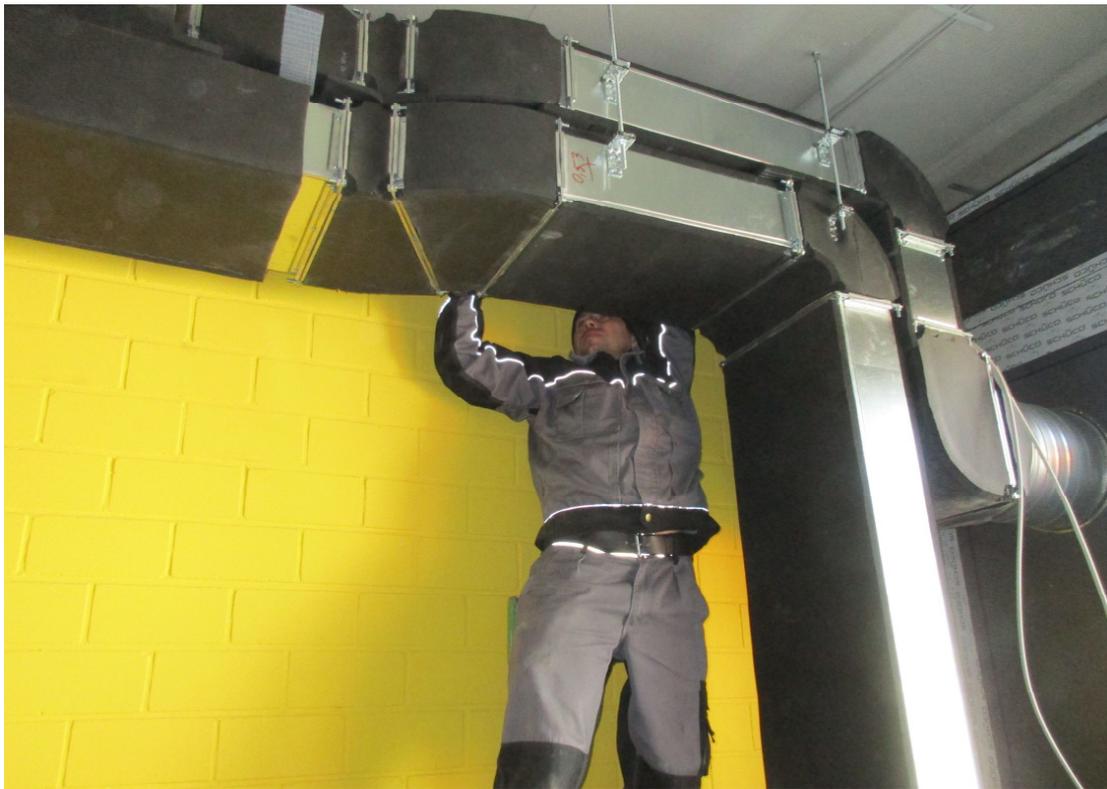

Im Gebäude werden zudem weiter Leitungen verlegt, ehe die Unterkonstruktion der abgehängten Decken eingebaut wird.



In Gebäude A ist die Unterkonstruktion der abgehängten Decke bereits montiert. Hier werden zurzeit noch Fenstersimse eingebaut.



Durch den Frost konnte in der letzten Woche die Firma Lembke keine Arbeiten an dem Wärmedämmverbundsystem durchführen. Diese Arbeiten wurden seit Montag wieder aufgenommen.

La
