



Bericht von der Baustelle Rathaus

Im Rathausneubau werden derzeit die ersten Schaltschränke im Technikraum verkabelt. Hunderte von Kabeln müssen hier in den Schaltschrank eingefahren und auf die entsprechenden Klemmen aufgelegt werden.

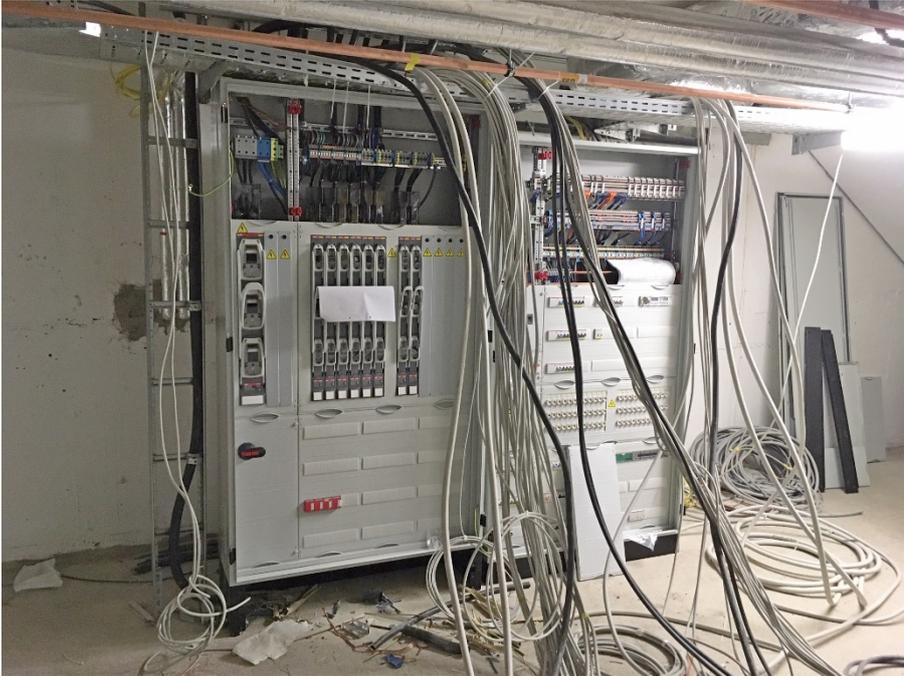

Die zwei raumhohen Schaltschränke sind gut zu erkennen. Die ersten Sicherungen sind bereits montiert. Ein Großteil der Leitungen ist schon im Schaltschrank verklemmt.

In der vergangenen Woche gingen die Fliesenarbeiten in großen Schritten voran. Im Erdgeschoss ist bereits ein Großteil der Fläche mit den neuen Feinsteinzeugfliesen verlegt. Bei der Verlegung der Fliesen wurden Fugenkreuze benutzt. Zeitnah nach der Verlegung werden die Fliesen mit einer zementären Fugenmaße verfügt.

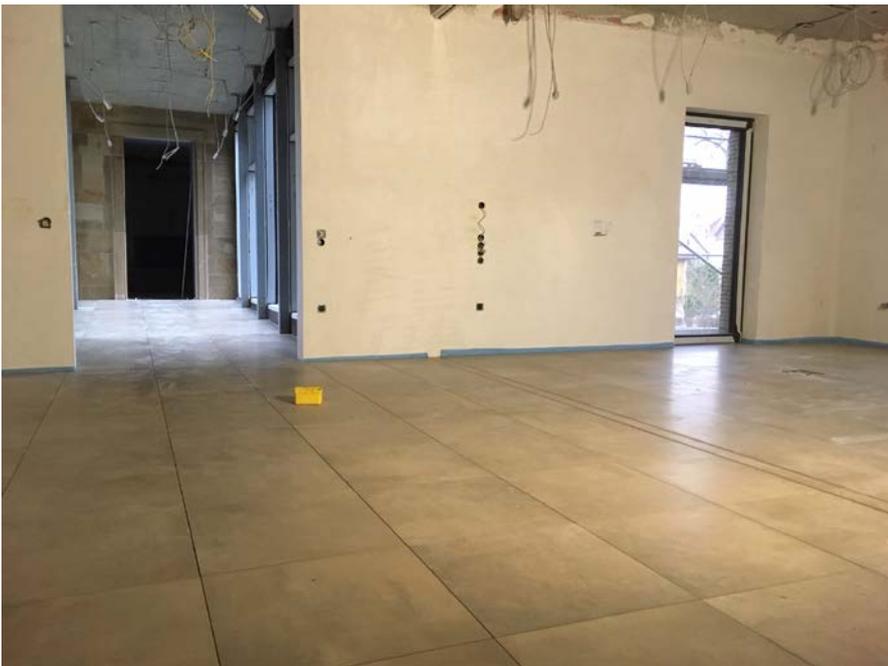

Die quadratischen Feinsteinzeugfliesen sind gut sichtbar. Sie wurden in einem Kreuzverband verlegt.

Im historischen Rathaus gehen die Ausbauarbeiten im Dachgeschoss zügig voran. Hier arbeiten aktuell die Trockenbauer. Die Wände werden mit Gipskartonplatten beplankt. Die Decken werden mit einer Metallunterkonstruktion abgehängt und anschließend mit Gipskartonplatten versehen.



Die beplankten Wände sind bereits fertiggestellt und werden noch verspachtelt. Die Deckenkonstruktion ist bereits aufgebracht. Anschließend wird die Konstruktion mit Gipskartonplatten versehen. Das Gebälk soll sichtbar bleiben.

SB
